


RAPPORT DE TRAVAUX

CONTINUITÉ ECOLOGIQUE – Centrale de PETITE HURTIÈRE

1 - Fabrication d'un bac déversoir aux bords arrondis, en atelier

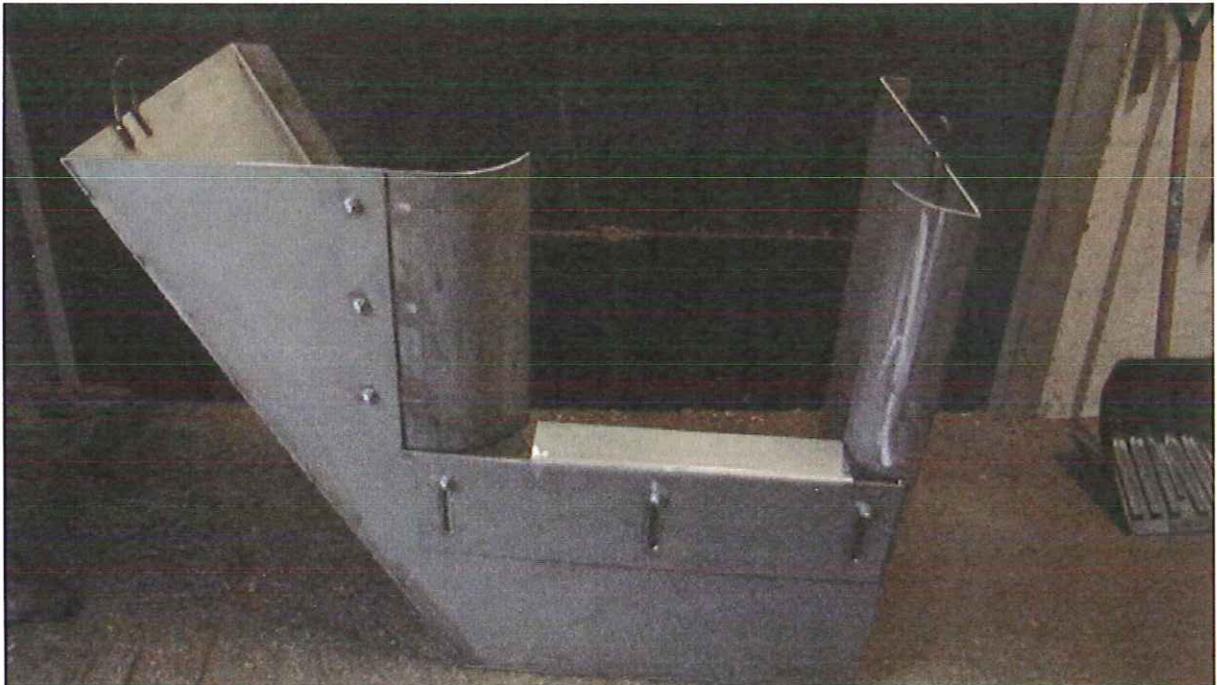

2 - Pose du bac déversoir

Travaux réalisés le mercredi 9 mars 2016 :

- Enlèvement du coude plongeant pour favoriser l'entrée des poissons dans l'ouvrage de dévalaison
- Pose du bac déversoir et fixation au mur manuellement



- Mise en eau du bac



3 – Débit réservé


Le débit réservé transite dans un bassin de dissipation puis dans une conduite d'évacuation avant d'être restitué à la Fure.



Le bassin de dissipation permet la lecture de la lame d'eau et donc le contrôle du débit réservé.

Contrôle du débit réservé

Le contrôle se fait au niveau du bassin de dissipation.

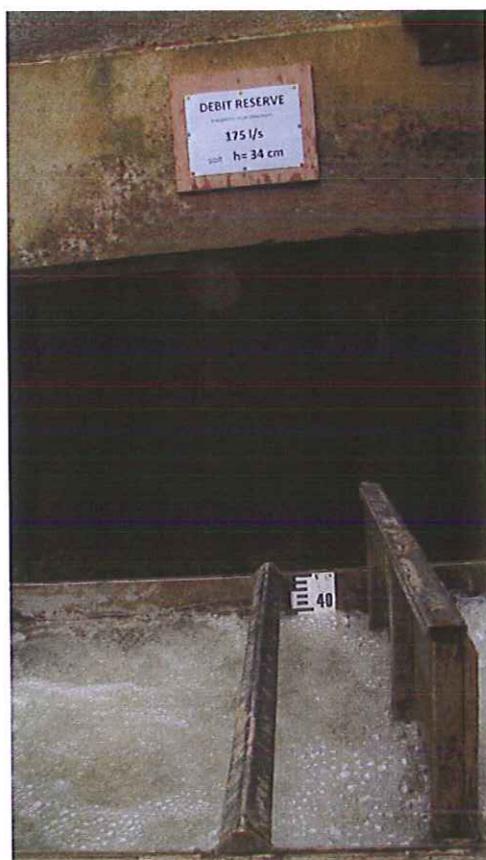

L'échelle indique une hauteur de 38 cm, soit un débit réservé bien supérieur à celui exigé.
